



CITTÀ DI CANICATTÌ

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DIREZIONE III - P.O. n. 5

"Servizi tecnici territoriali, Sviluppo economico e Programmazione"

LAVORI PER LA MESSA A NORMA, RISTRUTTURAZIONE E COLLOCAZIONE
ERBA SINTETICA STADIO CARLOTTA BORDONARO

CUP: H52E17000070001

PROGETTO ESECUTIVO PRIMO STRALCIO

TAV. 7.6	ELABORATO	ELABORATI ECONOMICI Cronoprogramma	SCALA
-------------	-----------	---------------------------------------	-------

CITTA' DI CANICATTI'
UFFICIO TECNICO

Parere Tecnico n° 14 del 2020

Visto si esprime parere favorevole all'approvazione del
PROGETTO ai sensi dell'art. 5 della L.R. 12/07/2011 n. 12
e dell'art. 24 della L.R. n. 8 del 2016 di recepimento del D. L.vo
18/04/2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni per
l'importo complessivo di € 1.095.000,00
Canicattì li 10 APR 2020

R.U.P.

(Geom. Antonio La Vecchia)



Progettista:

Ing. Gioacchino Meli

13 DIC 2019

Collaborazione:

Geom. Giuseppe Cipollina

Geom. Diego Sfalanga


R.U.P.:

Geom. Antonio La Vecchia

Categorie di opere		FASE 1						FASE 2						FASE 3					
Importo	Tempo (mesi)	€ 101.156,60						€ 370.276,99						€ 435.058,97					
Scavi, demolizioni e trasporti Vespai																			
€ 61.305,47	3																		
Conglomerati, Acciaio. Casseforme																			
€ 100.137,42	3																		
Opere murarie, intonaci, infissi Pavimentazioni e rifiniture																			
€ 152.154,49	4																		
Impianto elettrico																			
€ 9.666,52	1,5																		
Impianto idrico																			
€ 45.993,29	2																		
Realizzazione manto campo di gioco																			
€ 537.235,37	5																		
	Mesi	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Importo dei lavori € 906.492,56 </div>	Importo mensile dei lavori in euro	€ -	€ 10.217,58	€ 10.217,58	€ 26.907,15	€ 26.907,15	€ 26.907,15	€ 26.907,15	€ 35.708,88	€ 89.432,42	€ 72.742,85	€ 72.742,85	€ 72.742,85	€ 84.241,17	€ 84.241,17	€ 87.463,34	€ 68.444,03	€ 56.945,71	€ 53.723,54
	Imp. progressivo dei lavori in euro	€ -	€ 10.217,58	€ 20.435,16	€ 47.342,31	€ 74.249,45	€ 101.156,60	€ 128.063,75	€ 163.772,63	€ 253.205,05	€ 325.947,90	€ 398.690,75	€ 471.433,59	€ 555.674,77	€ 639.915,94	€ 727.379,28	€ 795.823,31	€ 852.769,02	€ 906.492,56

DIAGRAMMA A BARRE

DIAGRAMMA AVANZAMENTO DEI LAVORI

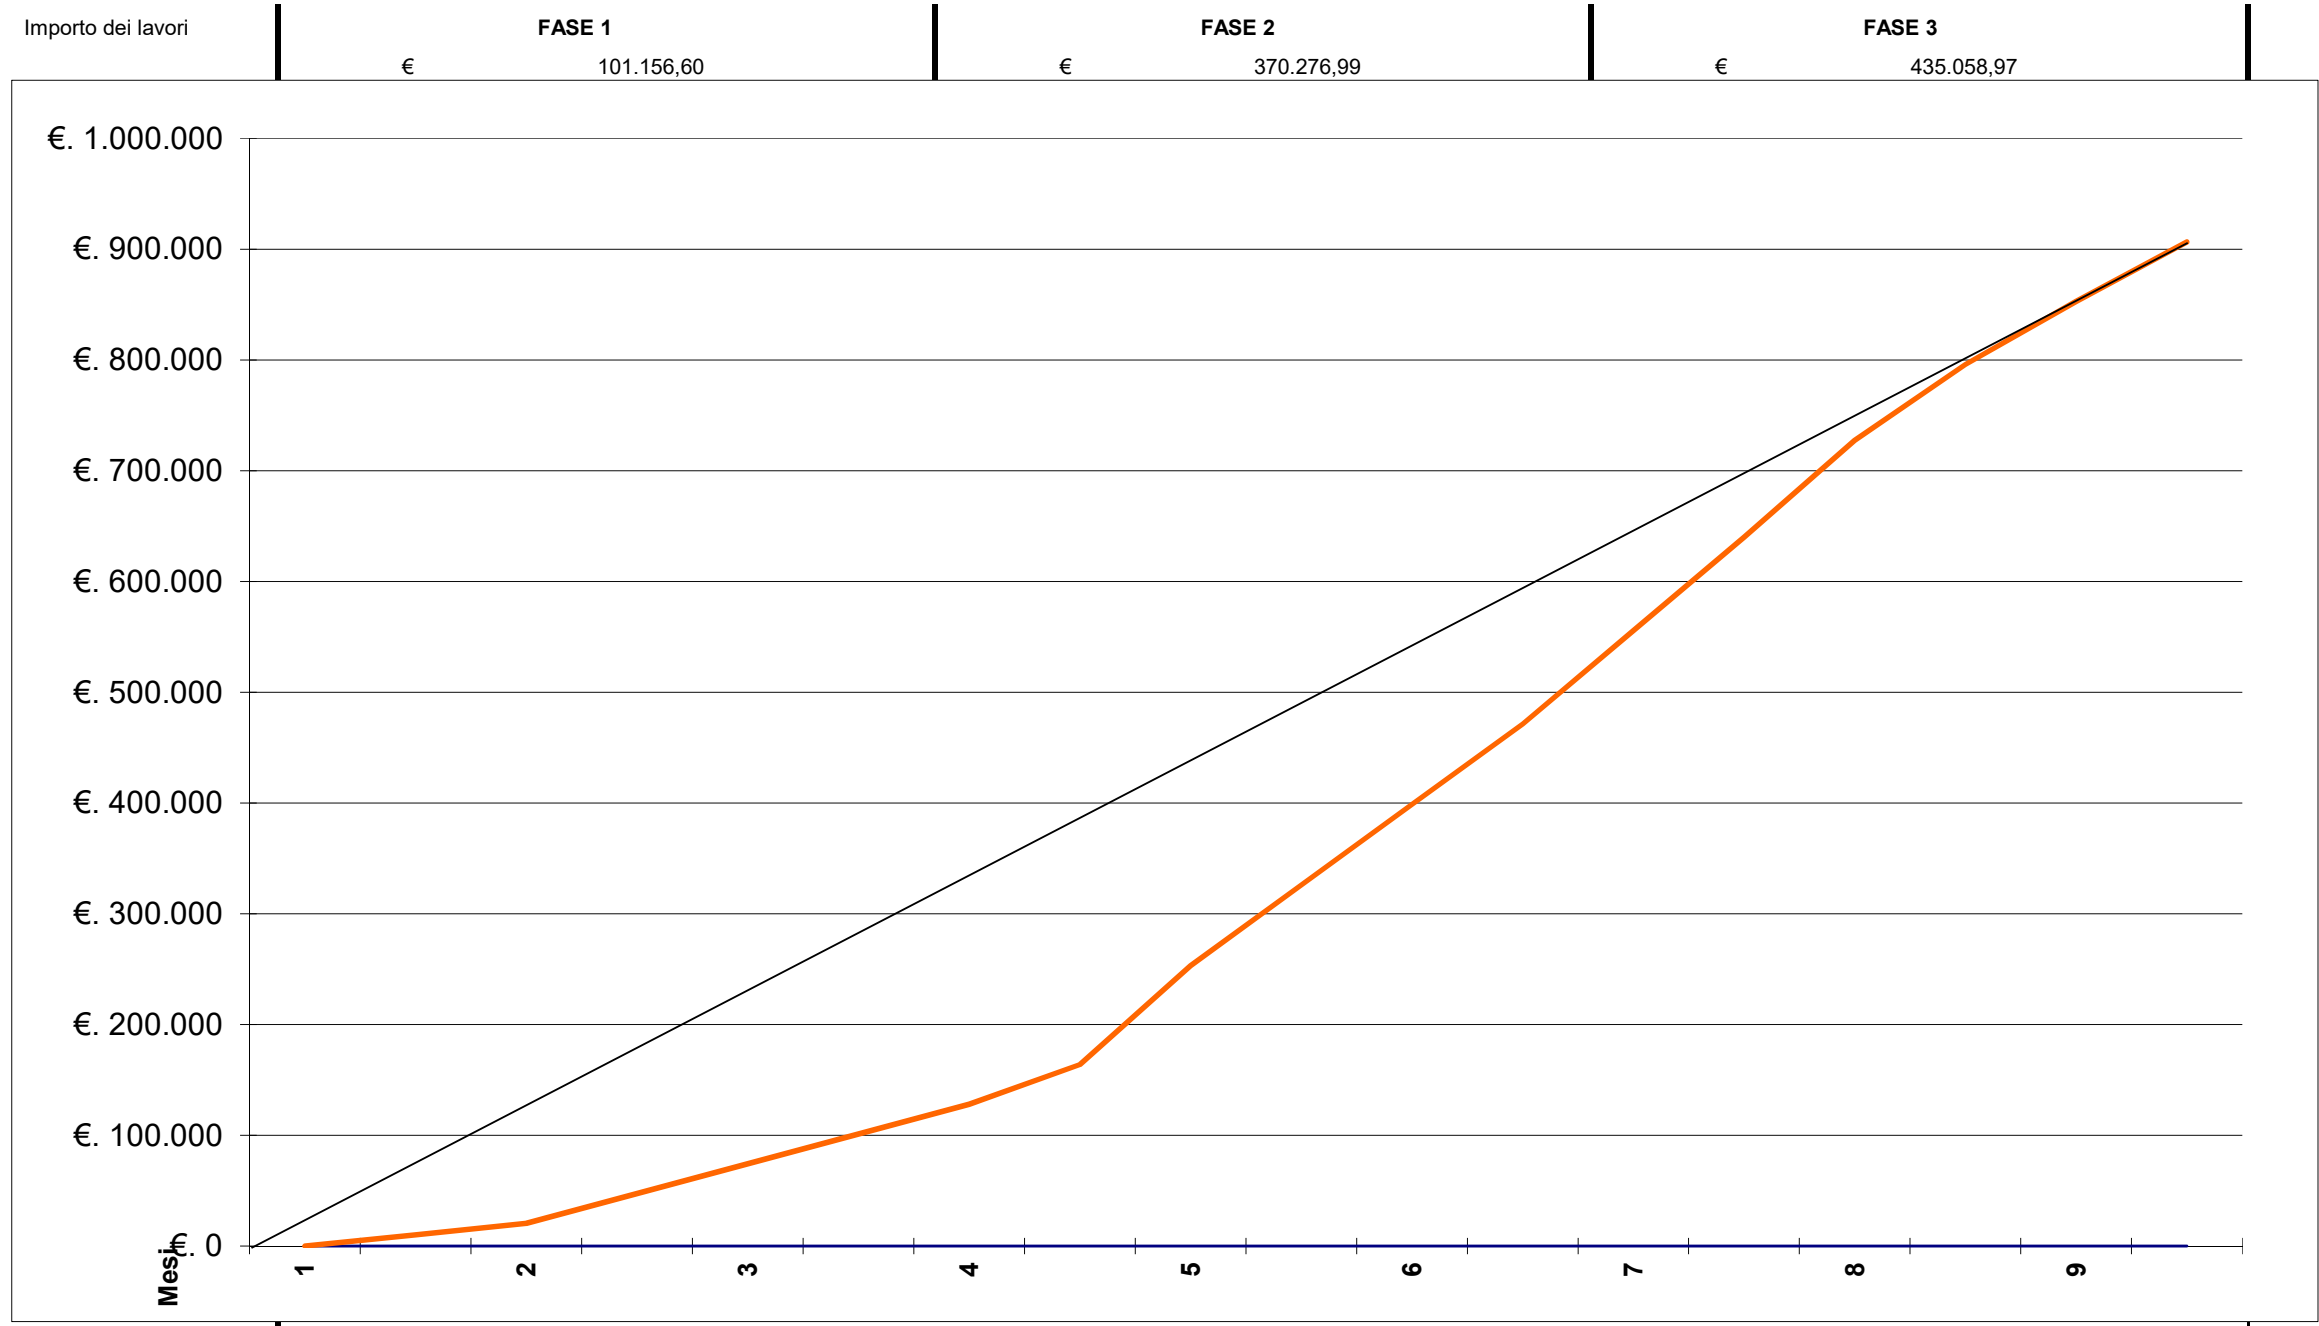

Importo dei lavori
€ 906.492,56

Avanzamento %	Imp. progressivo dei lavori in euro
0,00	€ -
1,13	€ 10.217,58
2,25	€ 20.435,16
5,22	€ 47.342,31
8,19	€ 74.249,45
11,16	€ 101.156,60
14,13	€ 128.063,75
18,07	€ 163.772,63
27,93	€ 253.205,05
35,96	€ 325.947,90
43,98	€ 398.690,75
52,01	€ 471.433,59
61,30	€ 555.674,77
70,59	€ 639.915,94
80,24	€ 727.379,28
87,79	€ 795.823,31
94,07	€ 852.769,02
100,00	€ 906.492,56
